


- ✓ El proceso de pago es a través del sistema SIAFI
- ✓ El sistema posee los documentos tipo.
- ✓ El sistema de pago es mediante transferencia electrónica.
- ✓ Para realizar las transferencias de pago la Tesorería General de la República (TGR), ha establecido dos momentos en los cuales autoriza dichas transferencias (11:00 m. y 3:00 p.m.) de martes a viernes de cada semana.

PAGO CON FONDOS EXTERNOS POR TESORERIA Y CON FONDOS NACIONALES

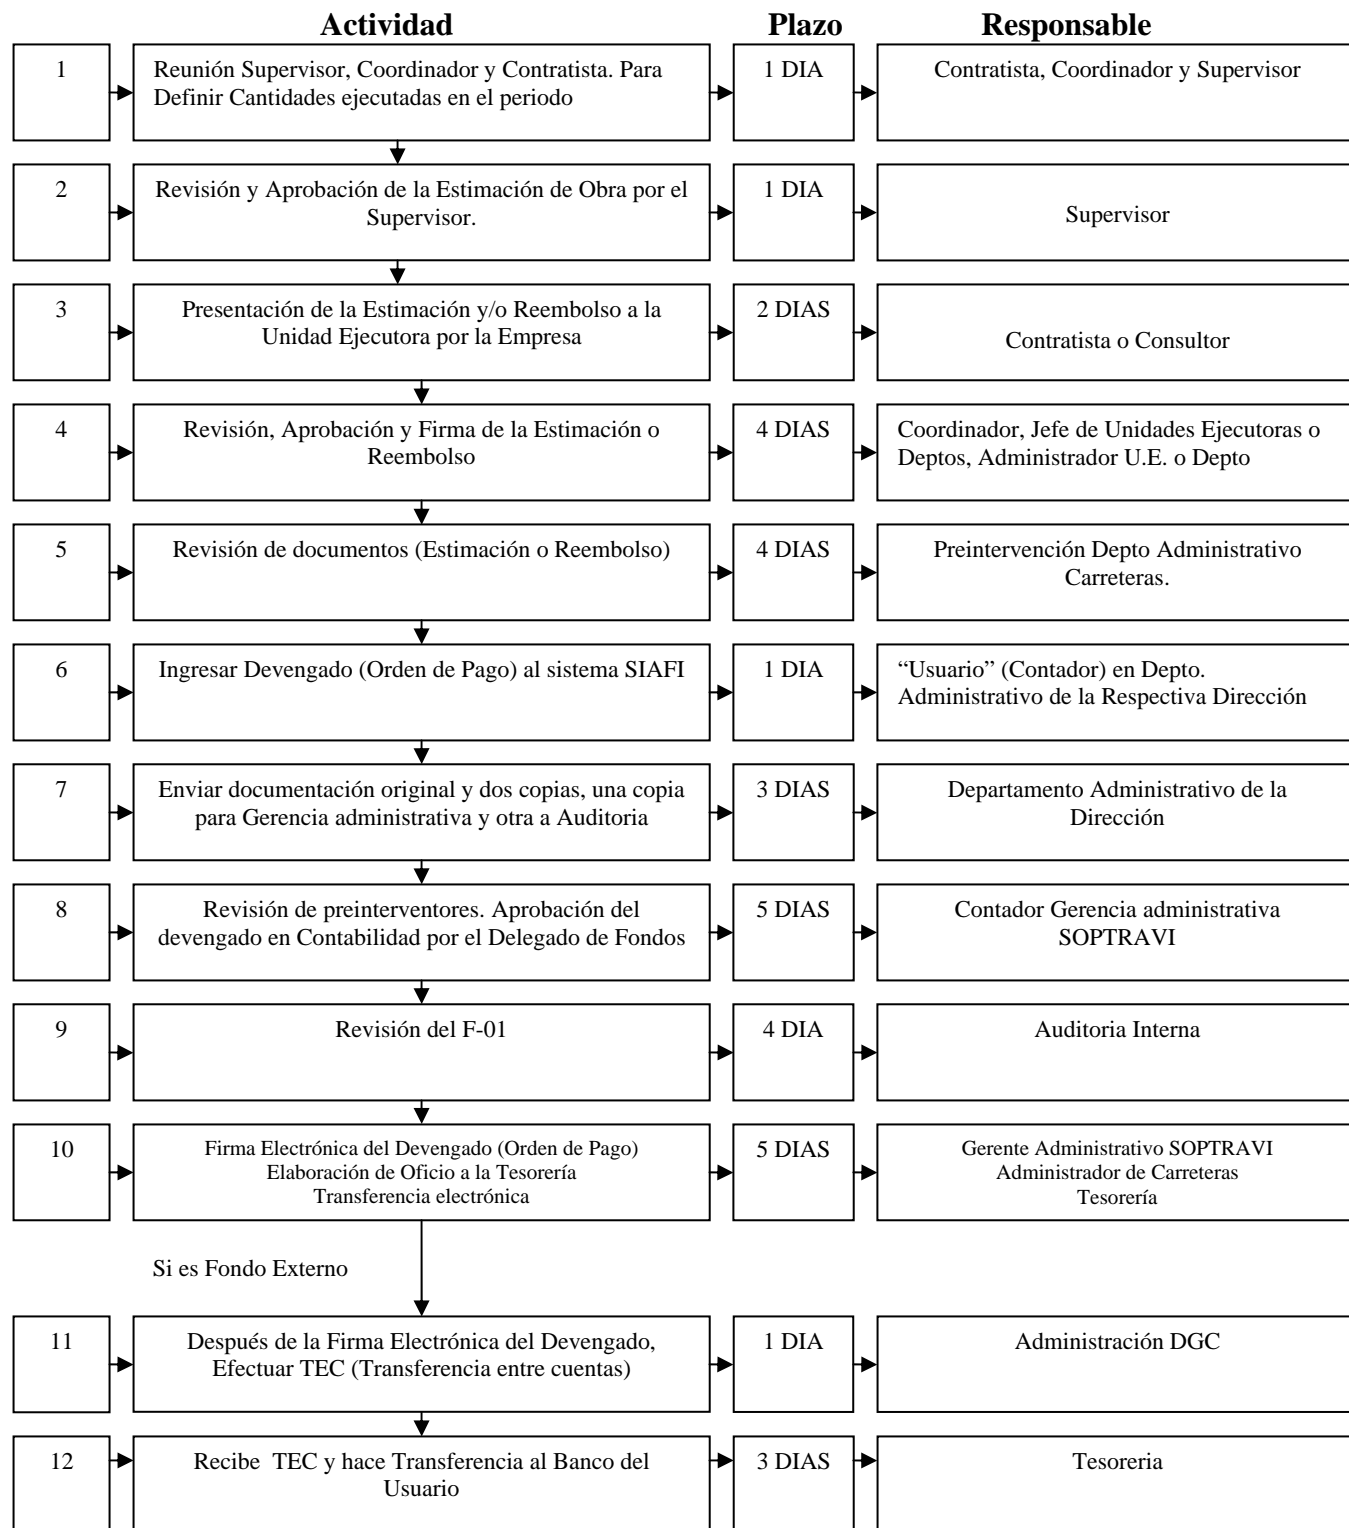

Duración total estimada para que la Empresa reciba el Pago: 33 DIAS para Fondo Externo y 29 días para Fondos Nacionales

PAGO DIRECTO CON FONDOS EXTERNOS

	Actividad	Plazo	Responsable
1	Reunión Supervisor, Coordinador y Contratista. Para Definir Cantidades ejecutadas en el periodo	1 DIA	Contratista, Coordinador y Supervisor
2	Revisión y Aprobación de la Estimación de Obra por el Supervisor.	1 DIAS	Supervisor
3	Presentación de la Estimación y/o Reembolso a la Unidad Ejecutora por la Empresa	2 DIAS	Contratista o Consultor
4	Revisión, Aprobación y Firma de la Estimación o Reembolso	4 DIAS	Coordinador, Jefe de Unidades Ejecutoras o Deptos, Administrador U F. o Dento
5	Revisión de documentos (Estimación o Reembolso)	4 DIAS	Preintervención Depto Administrativo Carreteras
6	Se manda formulario para trámite de V.B	1 DIA	Dirección
7	Firma del Formulario	2 DIAS	Vice-Ministro
8	Regresa para agregar doc. Soporte y enviar al BID	1 DIA	Ente Ejecutor
9	Tramite	8 DIAS	BID
10	Transferencia al Banco del Beneficiario	1 DIA	Banco

Duración total estimada para que la Empresa reciba el Pago: 25 DIAS

10	Trámite de regularización del pago	13 DIAS	Ente Ejecutor
----	------------------------------------	---------	---------------
